

Inteligencia de mantenimiento ferroviario

Riesgo, priorización de taller, vida remanente y disciplina económica del mantenimiento basado en condición



La decisión inmediata no es desplegar más analítica: es ejecutar una cola de taller gobernada por riesgo, corregir la asignación de capacidad y tratar CBM como una opción de nivel de servicio hasta que el caso financiero quede calibrado con costes reales.

PERIODO ANALIZADO

2024-01-01 a 2025-12-29

ALCANCE

144 unidades · 1.152 componentes críticos

RED DE TALLERES

10 depósitos · 6 flotas

CONTROLES DE GOBERNANZA

50 activos · 0 bloqueos de publicación

CONTENIDO Y SECUENCIA DE DECISIÓN

Índice

Resumen ejecutivo	3
1. Contexto y objetivos	6
2. Datos y metodología	7
3. Marco analítico	10
4. Diagnóstico operativo	11
5. Fiabilidad, inspección y vida remanente	17

6. Priorización y capacidad de taller	24
7. Economía y decisión estratégica	30
8. Riesgos, limitaciones y cautelas	35
9. Recomendaciones y prioridades de acción	36
Apéndice. Métricas, fuentes e interpretación	38

Resumen ejecutivo

El sistema no produce una lista de indicadores: ordena una decisión operativa concreta. La pregunta de gestión es qué unidades y componentes entran primero en taller, cuánto cuesta aplazar cada intervención y dónde la capacidad está mal asignada. Este informe responde a esas preguntas con evidencia cuantificada y separa con claridad el valor operativo de la condición técnica del coste económico, que bajo los supuestos actuales no respalda una afirmación de ahorro.

95,7% Disponibilidad media de flota	43 Casos con alto riesgo de diferimiento	+20,5 p.p. Mejora de casos ejecutables tras rediseño	-48,7 M€ Diferencial neto de CBM frente a reactiva
---	--	--	--

Agenda de comité

Decisión	Evidencia crítica	Mandato recomendado
Ejecutar cola de riesgo	3 casos superan 85 puntos; los 10 primeros concentran 85,0 puntos de prioridad media y 70,8 de riesgo medio de diferimiento, con impacto de servicio medio 74,8.	Aprobar ejecución P1/P2 con excepción documentada y revisión diaria de repuesto, ventana y capacidad.
Adoptar programación a 35 días	Accionabilidad +20,5 p.p.; riesgo residual no atendido -24,2 p.p.; valor capturado +1,04 M€.	Usar la heurística rediseñada como base inicial operativa y medir restricciones residuales semanalmente.
Rebalancear talleres	DEP01 concentra el 75,0% de los casos diagnosticados y el 81,6% de los pendientes por capacidad.	Transferir trabajo compatible antes de pedir capacidad adicional estructural.
Condicionar inversión CBM	+0,93 p.p. de disponibilidad frente a reactiva, pero -48,7 M€ de diferencial neto y 0% de escenarios con ahorro positivo.	Exigir puerta financiera: costes reales y valor corporativo >= € 2.618/h.

Lectura ejecutiva: el informe separa decisiones operativas ya accionables de decisiones de inversión que todavía requieren calibración financiera.

La flota mantiene una disponibilidad media del 95,75% durante el periodo 2024-01-01 a 2025-12-29. Ese nivel agregado es tranquilizador y, por sí solo, engañoso. Detrás de él se acumulan 2.056 pendientes físicos, de los cuales 2.011 están vencidos y 1.955 cumplen la definición de pendientes críticos físicos. La disponibilidad describe lo que ya ocurrió; no mide la exposición que se está acumulando. La gestión necesita una segunda capa que ordene la cola por riesgo y no por volumen, porque tratar todos los pendientes con la misma urgencia consume capacidad sin reducir la probabilidad de fallo donde más importa.

El sistema identifica 9 unidades en la cola estadística de alto riesgo y 43 intervenciones con riesgo de diferimiento igual o superior a 70 puntos. La primera decisión está nominada sin ambigüedad: intervenir UNI0055 / COMP000438, familia pantógrafo, con una puntuación de prioridad de 91,4 y un riesgo de diferimiento de 85,8. Su probabilidad estimada de fallo a 30 días es 90,3% y su vida remanente aproximada es de 3 días. La cabeza de la cola presenta puntuaciones muy próximas entre sí, de modo que cualquier excepción en la secuencia desplaza protección de servicio real y debe documentarse.

CONCLUSIÓN EJECUTIVA

La prioridad inmediata es proteger servicio con una cola de intervención basada en riesgo, mientras se corrige la asignación de capacidad entre depósitos. El caso de inversión en CBM no se presenta como ahorro: se fija el valor corporativo de la disponibilidad adicional y se recalibran costes antes de comprometer capital.

Lectura de comité: qué está decidido y qué no

El comité tiene dos decisiones de naturaleza distinta. La primera es operativa y está lista: proteger la cabeza de la cola, gobernar los casos de alto riesgo de diferimiento y mover trabajo hacia los depósitos con capacidad compatible. La evidencia converge en la misma dirección: riesgo técnico, impacto de servicio, ventana de

intervención, restricción de taller y coste de aplazar. La segunda decisión es de capital y aún no está lista. CBM mejora disponibilidad, pero el modelo no muestra ahorro neto bajo los supuestos actuales. Mezclar ambas decisiones deterioraría la credibilidad del caso: la organización debe actuar ya sobre la cola de riesgo y reservar la inversión CBM para una puerta financiera posterior.

La cola priorizada es lo bastante estrecha para gobernarse con disciplina ejecutiva. Solo 3 casos superan 85 puntos, 13 superan 80 y 138 superan 70 sobre 1.152 componentes evaluados. Los diez primeros se concentran en 5 unidades, con 7 bogies y 3 pantógrafos; su riesgo medio de diferimiento es 70,8, frente a 48,8 en la cartera completa. La implicación es clara: no hace falta sobregestionar toda la base de activos. Hace falta blindar una franja pequeña donde cada aplazamiento destruye protección de servicio.

Cinco decisiones concentran el valor de gestión

Primero, ejecutar la cabeza de cola y proteger los 43 casos de alto riesgo de diferimiento con revisión diaria. Segundo, adoptar la heurística de programación a 35 días: los casos accionables suben del 29,8% al 50,3%, mientras el riesgo residual no atendido baja del 69,0% al 44,8% y el valor capturado aumenta 1,04 M€.

Tercero, evitar aplazamientos no justificados. Diferir 14 días añade 0,33 M€ de coste aproximado y 441 horas de indisponibilidad frente a intervenir en el día cero. Cuarto, concentrar la fiabilidad en pantógrafos, que combinan la peor salud media y el mayor riesgo medio de fallo (46,1%). Quinto, tratar CBM como una decisión de nivel de servicio: bajo los supuestos vigentes mejora la disponibilidad en +0,93 puntos porcentuales frente a reactiva, pero su diferencial neto esperado es -48,7 M€, con una probabilidad modelada de ahorro positivo del 0%.

1. Contexto y objetivos

Una operación ferroviaria no puede decidir mantenimiento con una única señal. Un componente con salud baja puede tener escaso impacto de servicio si su unidad opera en rutas redundantes; una unidad con riesgo moderado puede convertirse en prioridad si el aplazamiento eleva la probabilidad de fallo o si la siguiente ventana operativa disponible es distante. Estas tensiones se resuelven a diario de forma implícita en la planificación de taller, casi siempre sin un criterio común y trazable. El proyecto las integra en una secuencia de intervención explícita que conecta condición técnica, presión de servicio y restricción de capacidad.

El alcance cubre 6 flotas, 144 unidades, 1.152 componentes críticos y 10 depósitos, con dos años de cobertura temporal que abarcan señales de sensor, operación, fallos, inspecciones automáticas y eventos de mantenimiento. La amplitud importa porque permite distinguir patrones estructurales de episodios aislados: una unidad recurrente en la cola de riesgo durante varios meses plantea un problema de activo distinto al de una unidad que aparece una sola vez tras un incidente puntual.

Los objetivos analíticos se traducen en preguntas de decisión

El análisis responde a seis preguntas operativas. Qué unidades y componentes deben entrar primero en taller. Cuánto cuesta aplazar cada intervención. Dónde existe presión excesiva o capacidad ociosa. Qué señales explican el riesgo. Qué familias técnicas requieren una política diferenciada. Y qué estrategia de mantenimiento ofrece el mejor equilibrio entre servicio, coste y riesgo. Ninguna de estas preguntas se responde con un único número, y la arquitectura del sistema está deliberadamente construida para no forzarlo.

La estructura de salida evita mezclar conceptos que se confunden con frecuencia. Los pendientes físicos miden carga pendiente real. El riesgo de diferimiento mide el daño esperado de posponer una decisión. La salud describe condición. El riesgo de fallo ordena propensión a corto plazo. La vida remanente se utiliza como ventana relativa de intervención, no como fecha exacta de fallo. Mantener separadas estas definiciones es lo que permite que cada métrica cumpla una función concreta sin contaminar a las demás.

2. Datos y metodología

La capa analítica parte de datos sintéticos deterministas de sensores, inspecciones automáticas, fallos, eventos de mantenimiento, disponibilidad, demanda de servicio y pendientes. El determinismo es una decisión de diseño: garantiza que cualquier persona que ejecute el flujo obtenga exactamente las mismas cifras, lo que es condición necesaria para auditar definiciones y reproducir hallazgos. Las tablas procesadas preservan granularidades separadas para componente-día, unidad-día, flota-semana, depósito-día e intervención-corte, de modo que cada análisis opera al nivel correcto y no agrega magnitudes incompatibles.

Esa separación de grano es la primera línea de defensa contra errores de interpretación. La disponibilidad se analiza por flota-semana; el riesgo y la vida remanente, por componente; la presión de taller, por depósito-día; y la prioridad de intervención, por caso en el corte más reciente. Sumar pendientes históricos acumulados y compararlos con un corte de pendientes actuales produciría una cifra sin significado, y la arquitectura lo impide por construcción.

Niveles de grano preservados por la capa analítica. Cada análisis opera en su grano natural y no se agregan magnitudes definidas a niveles distintos.

La calidad se controla con contratos de datos y métricas

Granularidad	Qué mide	Origen
Componente-día	Salud, riesgo de fallo, vida remanente, deterioro	Modelo de salud y riesgo
Unidad-día	Riesgo de indisponibilidad, exposición de servicio	Tabla analítica de unidad-día
Flota-semana	Disponibilidad, MTBF y MTTR aproximados	Tabla analítica semanal de flota
Depósito-día	Saturación, presión y capacidad de taller	Tabla analítica de presión de talleres
Intervención-corte	Prioridad, riesgo de diferimiento, decisión	Modelo de priorización

Los contratos de publicación no presentan bloqueos activos

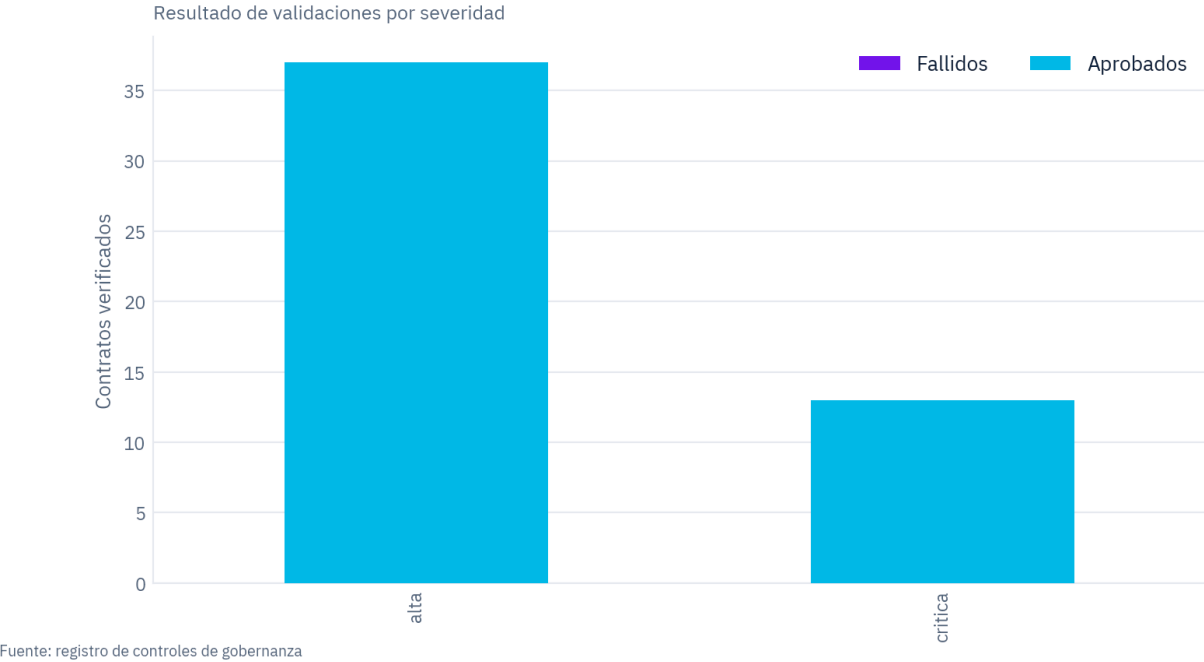


Figura. Las validaciones de publicación no presentan bloqueos activos: las 50 verificaciones, repartidas entre severidad alta y crítica, están aprobadas. Fuente: registro de gobernanza de métricas.

El registro de gobernanza contiene 50 verificaciones activas. Las 50 están aprobadas y 0 fallan; el número de bloqueos de publicación activos es 0. Los contratos fijan, para cada métrica comunicada, su fuente de verdad, su granularidad, su definición, su regla de agregación y su anti-interpretación, es decir, la lectura que queda explícitamente prohibida. Este último campo es el que impide, por ejemplo, que la vida remanente se comunique como fecha garantizada de fallo.

El resumen ejecutivo toma sus cifras de un registro oficial de métricas. La consecuencia práctica es que el panel de control, el README y este informe comunican la misma cifra para disponibilidad, pendientes, riesgo de diferimiento o valor estratégico, porque todos leen del mismo origen. La divergencia de cifras entre documentos es uno de los fallos más frecuentes y más corrosivos para la credibilidad de un sistema analítico, y aquí se elimina en origen en lugar de corregirse a mano.

Extracto del registro de contratos de métricas. El responsable define responsabilidad funcional; el grano válido bloquea agregaciones incompatibles; la madurez separa métricas listas para comunicación ejecutiva de métricas que requieren calibración adicional.

Las puntuaciones son interpretables y están orientadas a priorización

La salud del componente combina condición estimada, índice de deterioro, velocidad de degradación, defectos recientes de inspección y restauración tras mantenimiento. El riesgo de fallo utiliza una combinación lineal y sigmoide de señales de deterioro, estrés operativo, historial y exposición a pendientes. La puntuación de prioridad de intervención añade el impacto de servicio, el riesgo de diferimiento y el ajuste al taller recomendado. Cada capa es legible: una recomendación conserva su regla, su señal dominante, su nivel de confianza y su justificación, de forma que un planificador puede entender por qué un caso está por encima de otro.

El diseño favorece la trazabilidad sobre la complejidad predictiva. Es una elección deliberada: un modelo legible y auditable tiene más valor operativo que uno más opaco con mayor precisión aparente sobre datos que no ofrecen señal de validación externa. La contrapartida es explícita: antes de un uso operacional real, las puntuaciones requieren recalibración con histórico observado y validación temporal.

Métrica gobernada	Responsable	Grano válido	Madurez
Permiso de uso autónomo	Gobierno de modelo	puerta_modelo_ejecucion	alta
Pendientes físicos	Planificación de mantenimiento	corte_deposito_y_global	alta
Probabilidad calibrada de fallo a 30 días	Gobierno de modelo	componente_corte_temporal	baja
Diferencial operativo CBM vs reactiva	Estrategia de mantenimiento + Analítica financiera	estrategia_corte	media
Salud de componente	Analítica de fiabilidad	componente_corte	alta
Vida útil remanente estimada	Analítica de fiabilidad	componente_corte	media
Impacto de diferimiento a 14 días	Economía de operaciones	escenario_diferimiento	media
Disponibilidad de flota	Analítica de operaciones	flota_semana	alta

La comparación estratégica separa servicio, técnica y economía

Las estrategias reactiva, preventiva rígida y basada en condición se comparan bajo supuestos estructurales y varios perfiles de escenario. La simulación incorpora indisponibilidad, correctivas evitables, pendientes crítico, utilización de taller, coste técnico, coste económico y coste de habilitación. Los importes son aproximaciones técnico-operativas. No representan presupuesto, cuenta de resultados ni oferta contractual, y su función no es producir una cifra de ahorro sino hacer visibles las compensaciones y probar la estabilidad de una decisión ante variaciones de coste, capacidad, estrés de fallo y realización de la detección.

3. Marco analítico

La cadena de decisión conecta evidencia con ejecución en una secuencia ordenada. Comienza en la calidad del dato, convierte señales en estado y riesgo, estima una ventana relativa de intervención, ordena casos por prioridad, asigna capacidad de taller y cuantifica el coste de diferir. El resultado final no es una puntuación aislada sino una recomendación ejecutable, con depósito sugerido, secuencia y ventana operativa. Un control es esencial en toda la cadena: una señal técnica no genera por sí sola una orden de trabajo. La prioridad emerge de la combinación entre riesgo, impacto de servicio, oportunidad operativa y restricción de taller.

Las métricas se interpretan dentro de límites explícitos. Disponibilidad alta no implica bajo riesgo futuro. Un volumen elevado de pendientes no convierte todas las órdenes en urgentes. La correlación de una señal con el riesgo no prueba causalidad física. La vida remanente no es una fecha de fallo. El ahorro aproximado no es ahorro financiero. Estas distinciones no son matices académicos: cada una bloquea una decisión equivocada concreta, y el marco las mantiene activas en lugar de relajarlas para simplificar el mensaje.

Los umbrales del sistema organizan decisiones, no simulan certeza. El corte de alto riesgo en media más uno coma cinco desviaciones típicas es una regla de segmentación que concentra la atención, no una frontera física entre componentes sanos y enfermos. Los casos próximos a cualquier umbral deben revisarse junto con la confianza de la señal, la criticidad de servicio y la disponibilidad de repuesto. El marco está construido para soportar ese juicio experto, no para sustituirlo.

El modelo necesita derechos de decisión, no solo precisión

La calidad de un sistema de mantenimiento predictivo se mide por la decisión que cambia, no por la cantidad de señales que agrega. Por eso el marco separa recomendación, autorización y ejecución. El modelo prioriza; Planificación confirma factibilidad; Operaciones valida impacto de servicio; Finanzas revisa el caso económico;

Modelo operativo recomendado para que el sistema gobierne decisiones reales sin convertir la analítica en automatismo opaco ni en reporte pasivo.


Fiabilidad aprende de la intervención ejecutada. Esta asignación reduce dos riesgos habituales: automatizar una orden sin contexto operativo y, en el extremo opuesto, convertir la puntuación en una recomendación decorativa que nadie tiene obligación de seguir.

Decisión	Responsable	Evidencia mínima	Salida esperada
Priorizar intervención	Modelo + analítica de fiabilidad	Puntuación, RUL, fallo 30d, factor y confianza	Clasificación y nivel P1/P2/P3
Autorizar excepción	Dirección de Mantenimiento	Motivo, restricción, coste de diferir y nueva fecha	Excepción trazable
Asignar capacidad	Planificación de Taller	Horas, depósito, repuesto, ventana y compatibilidad	Plan de 35 días
Medir impacto	Operaciones + Finanzas	Disponibilidad, indisponibilidad, coste aproximado y servicio preservado	Revisión mensual
Recalibrar modelo	Reliability Analytics	Orden ejecutada, resultado observado, falsa alerta y reincidencia	Nuevo set de umbrales

4. Diagnóstico operativo

La disponibilidad agregada permanece alta y estable, pero el riesgo y los pendientes se concentran en una parte limitada de la red. El diagnóstico operativo consiste precisamente en localizar esa concentración para que la intervención sea focalizada en lugar de uniforme.

La disponibilidad se mantiene alta, pero no elimina la presión operativa

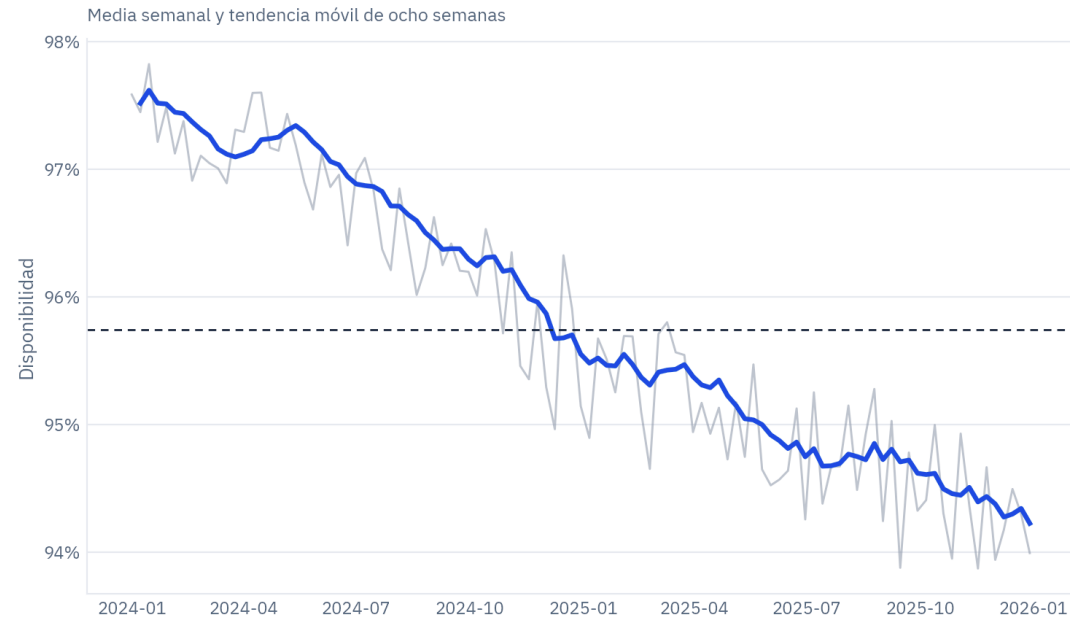

Fuente: tabla analítica semanal de flota


Figura. La disponibilidad media del periodo es 95,75% y la tendencia móvil de ocho semanas no muestra una ruptura estructural que por sí sola justifique una intervención estratégica. Fuente: tabla analítica semanal de flota.

La media del periodo es 95,75%, con un tiempo medio entre fallos aproximado de 1.047 horas y un tiempo medio de reparación aproximado de 5,2 horas. La serie semanal conserva un nivel alto sin quiebres abruptos. Esa estabilidad es real, pero es una medida retrospectiva: resume lo que ya ocurrió y no anticipa la exposición

que se está acumulando en la cola de componentes deteriorados. La gestión debe usar las dos capas a la vez y evitar la tentación de sustituir el puntuación de riesgo por el indicador de disponibilidad solo porque este último resulta cómodo y conocido.

El riesgo de unidad se concentra en una cola estrecha

9 de 144 unidades superan media + 1,5σ

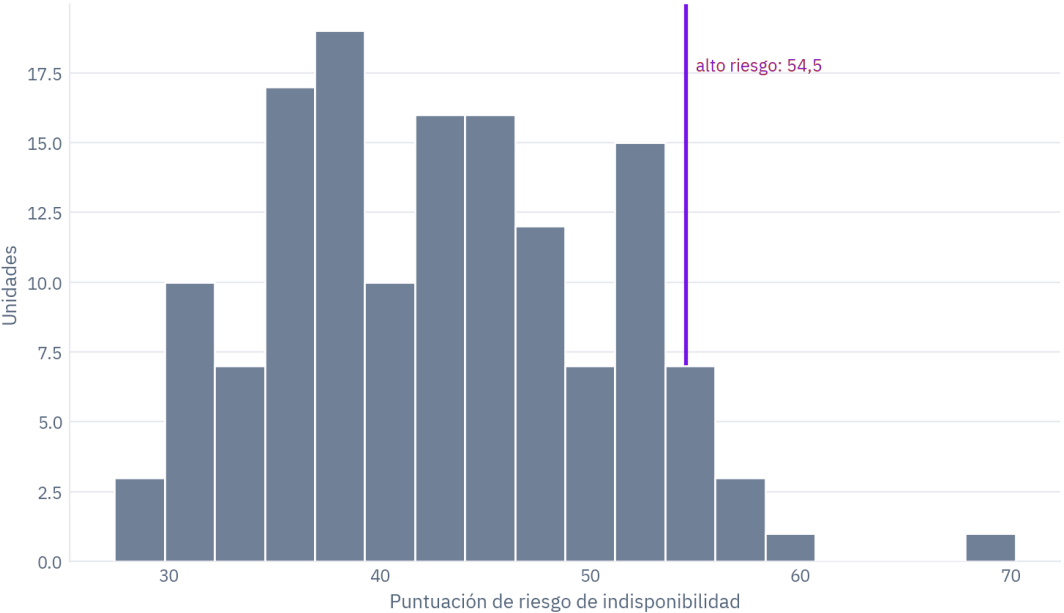

Fuente: modelo de riesgo de indisponibilidad


Figura. El umbral estadístico de alto riesgo, situado en media más 1,5 desviaciones típicas, captura 9 unidades de las 144 de la flota. Fuente: modelo de riesgo de indisponibilidad.

El riesgo de unidad se concentra en una cola estrecha. El umbral media más uno coma cinco sigma se sitúa en 54,5 puntos y captura 9 unidades. Una cola tan acotada es una buena noticia operativa: permite concentrar la revisión técnica en un número manejable de casos sin convertir el modelo en una alarma generalizada que la

organización aprendería a ignorar. El umbral, conviene insistir, es una regla de segmentación y no una frontera física; la dirección debe vigilar la estabilidad de la clasificación entre semanas antes de usarlo como criterio automático de parada.

Los pendientes se concentran en pocos depósitos

Participación y curva acumulada sobre el histórico agregado

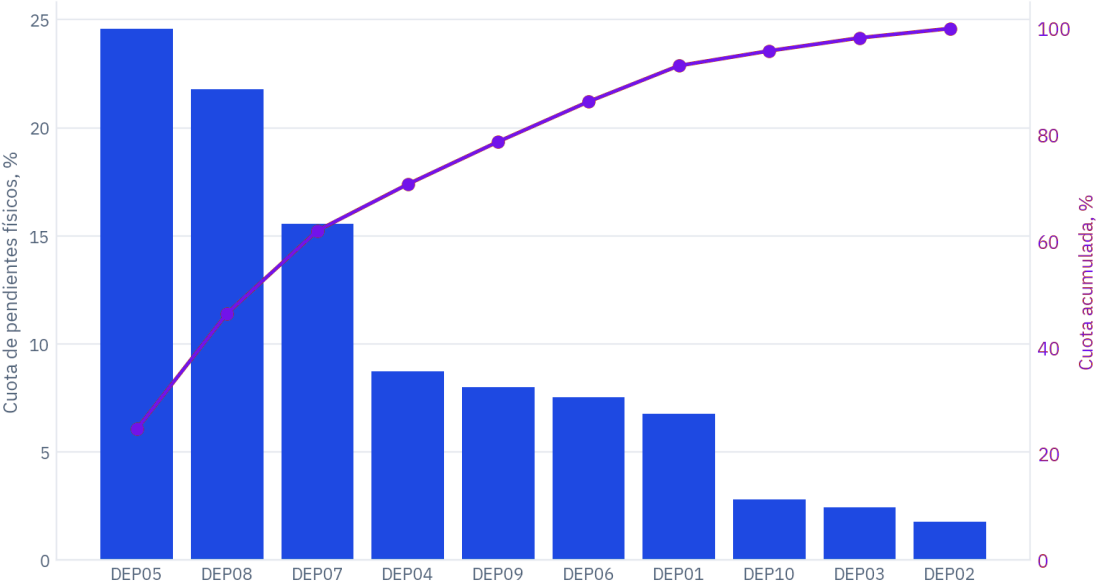

Fuente: tabla analítica de pendientes por depósito

Figura. Los tres depósitos con mayor volumen agregado de pendientes concentran el 62,0% del total histórico representado sobre los 10 depósitos. Fuente: tabla analítica de pendientes por depósito.

La carga pendiente está geográficamente concentrada. Los tres depósitos con mayor volumen agregado de pendientes reúnen el 62,0% del total histórico representado. Esa concentración convierte un problema difuso en uno tratable: en lugar de una campaña de cierre de pendientes en toda la red, la intervención se dirige a la

disciplina de cierre, la antigüedad de las órdenes y la asignación en un puñado de instalaciones. El volumen agregado por periodo no equivale al corte ejecutivo de pendientes físicos, y aquí se usa para localizar concentración persistente, no para comunicar el volumen actual.

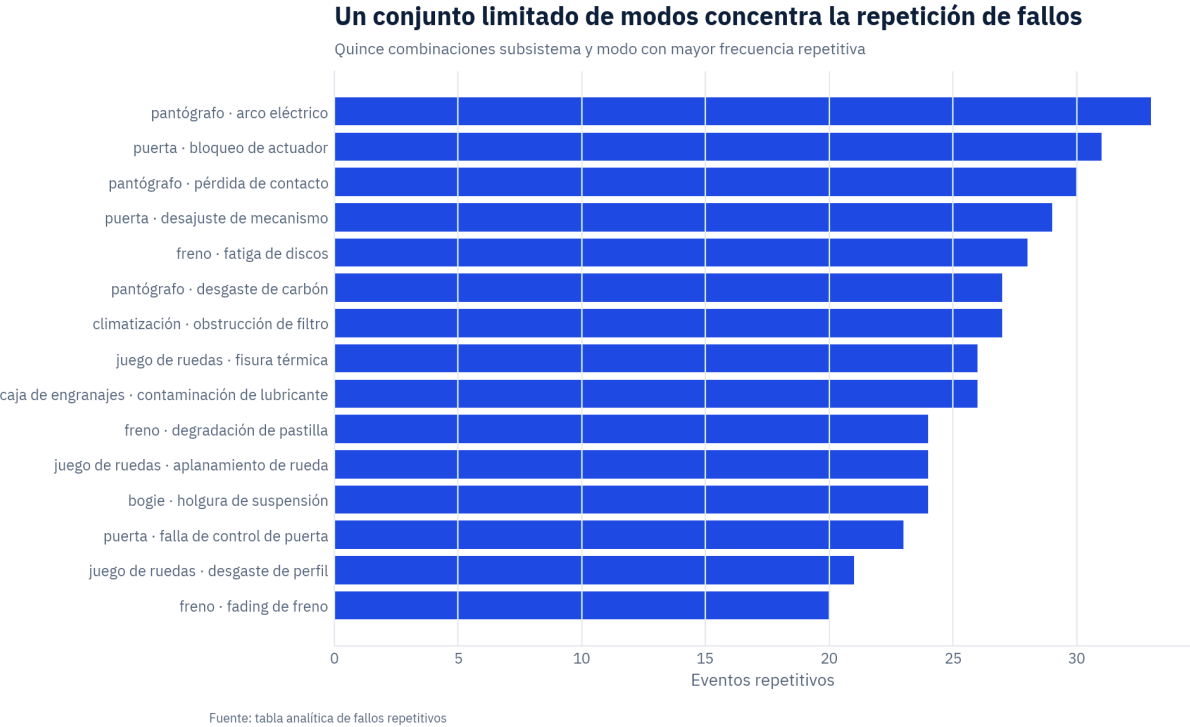



Figura. Los cinco modos con mayor repetición concentran el 28,4% de los eventos repetitivos incluidos en la clasificación. Fuente: tabla analítica de fallos repetitivos.

La repetición de fallos también admite tratamiento de cartera priorizada. Los cinco modos más frecuentes concentran el 28,4% de los eventos repetitivos de la clasificación, con el arco eléctrico, los bloqueos de actuador y la pérdida de contacto entre los primeros casos. Reducir esta repetición no es cuestión de acelerar

correctivas: requiere análisis de causa raíz, revisión del mantenimiento estándar y seguimiento de la reincidencia después de cada intervención. Una correctiva más rápida sobre el mismo modo que reaparece cada pocas semanas mejora un indicador de respuesta sin resolver el mecanismo subyacente.

La indisponibilidad histórica también está concentrada

Quince unidades con mayor tiempo fuera de servicio

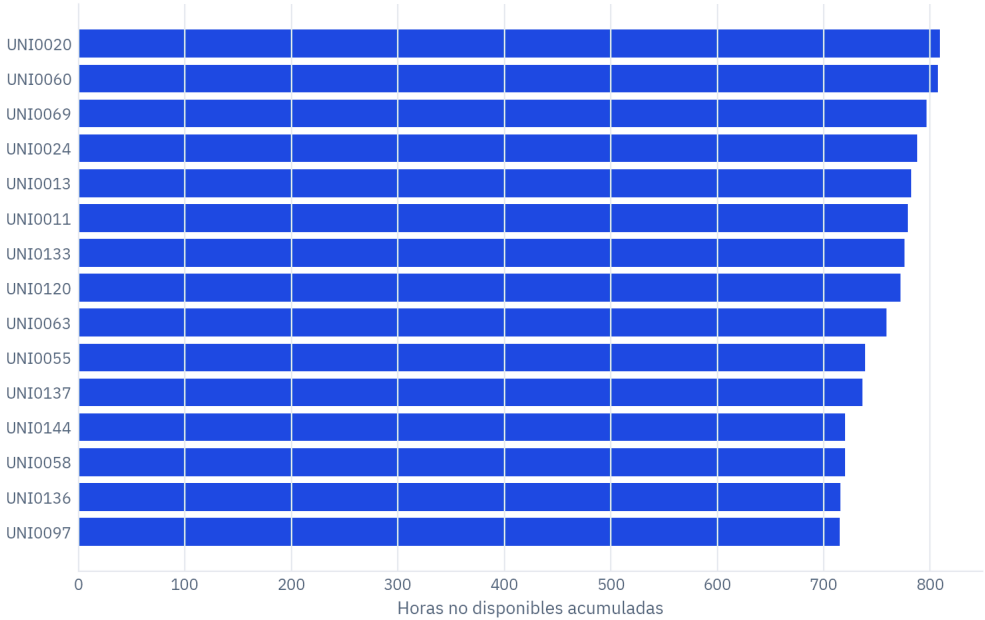

Fuente: tabla analítica de indisponibilidad por unidad

Figura. Un conjunto reducido de unidades concentra una proporción desproporcionada de las horas históricas fuera de servicio. Fuente: tabla analítica de indisponibilidad por unidad.

La indisponibilidad histórica está concentrada en pocas unidades, lo que apunta a un problema de activo más que a episodios independientes. Esta clasificación debe cruzarse con la cola de riesgo actual para distinguir la persistencia estructural de los episodios ya corregidos. Las unidades que aparecen en ambas listas son candidatas a una revisión de causa raíz y a una estrategia de activo específica, porque repetir intervenciones aisladas sobre el mismo vehículo consume capacidad sin atacar el mecanismo que lo devuelve al taller.

ACCIÓN EJECUTIVA

Operaciones debe abrir una revisión de las unidades de alto riesgo y explicar mensualmente la disponibilidad por flota; Mantenimiento debe lanzar planes de causa raíz para los cinco modos más repetitivos y depurar el pendientes antiguos en los tres depósitos que concentran la carga.

5. Fiabilidad, inspección y vida remanente

Las políticas de mantenimiento deben diferenciar familias técnicas. Los pantógrafos concentran el riesgo, el cálculo aproximado de vida remanente ya distingue ventanas útiles de intervención y la inspección automática rinde de forma desigual según la familia. Una política uniforme diluiría todas estas diferencias.

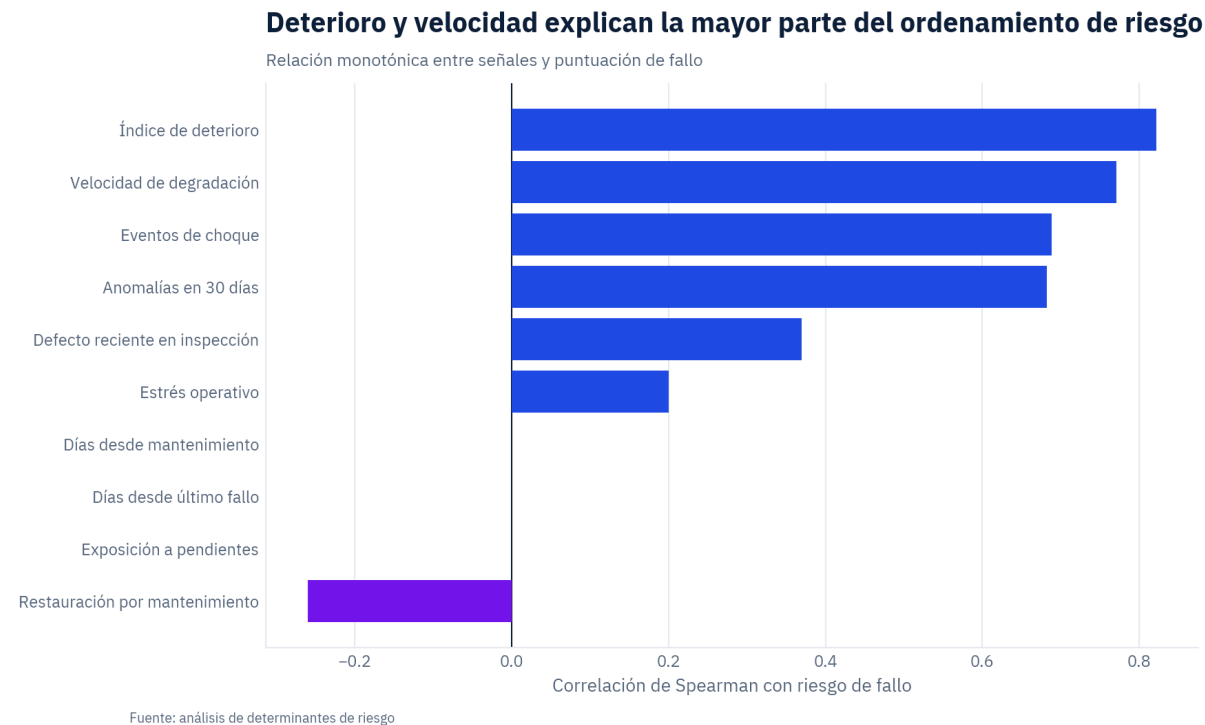



Figura. El índice de deterioro y la velocidad de degradación encabezan la correlación de Spearman con el riesgo de fallo; la restauración por mantenimiento aparece con signo negativo. Fuente: análisis de determinantes de riesgo.

El ordenamiento de riesgo está dominado por señales de deterioro. El índice de deterioro presenta una correlación de Spearman de 0,82 con el riesgo de fallo y la velocidad de degradación, de 0,77. Los eventos de choque (0,69) y las anomalías de los últimos 30 días (0,68) aportan separación adicional relevante. El índice de restauración por mantenimiento muestra una relación negativa de -0,26, coherente con la reducción de riesgo esperada tras una intervención efectiva.

Las variables con correlación próxima a cero no deben eliminarse de forma automática. La exposición a pendientes, los días desde el último fallo o desde el último mantenimiento no ordenan el riesgo de forma monótonica, pero pueden actuar como reglas de contexto o como restricciones que condicionan la decisión final. Confundir ausencia de correlación monótonica con ausencia de valor informativo es un error que empobrecería el modelo.

La salud baja separa el riesgo, pero no sustituye la evidencia de deterioro

Cada punto representa un componente crítico

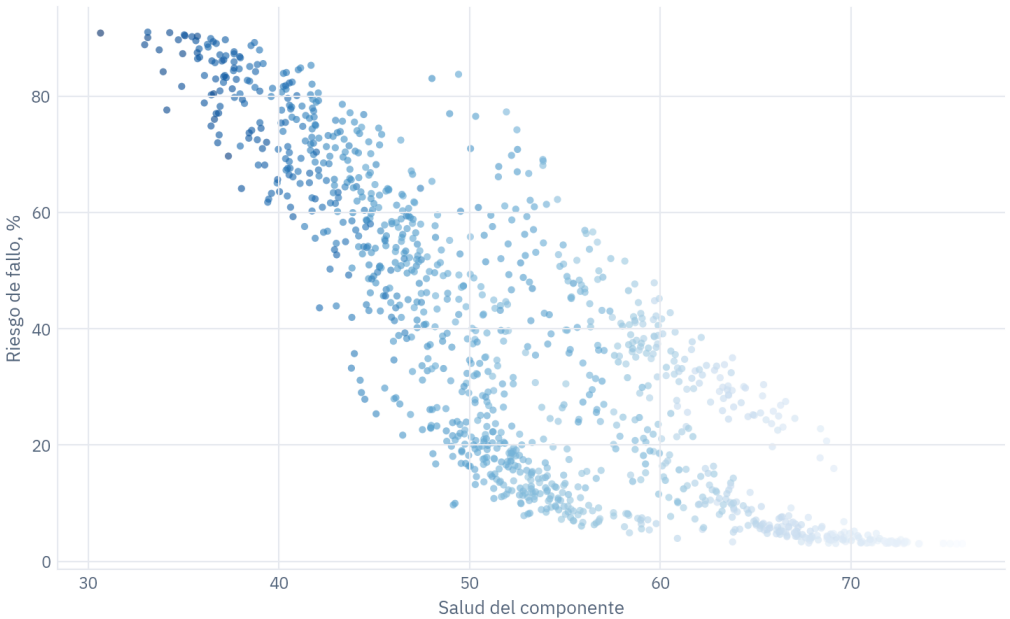

Fuente: modelo de salud y riesgo de componentes

Figura. Para niveles de salud similares persiste dispersión material en el riesgo de fallo, porque la trayectoria de deterioro, las anomalías y el estrés separan la exposición. Fuente: modelo de salud y riesgo de componentes.

La salud resume condición, pero el riesgo incorpora trayectoria. La nube de componentes confirma una relación inversa entre ambos, con una dispersión notable para niveles de salud parecidos. Esa dispersión procede de la velocidad de degradación, de las anomalías, del estrés operativo y de la restauración tras mantenimiento. Una política basada solo en salud perdería componentes con trayectoria adversa que todavía

exhiben una condición aceptable, y sobre-reaccionaría ante componentes estables de salud baja pero sin deterioro activo. La cola de taller debe conservar la puntuación de riesgo y la evidencia subyacente, no colapsar la decisión en una sola cifra.

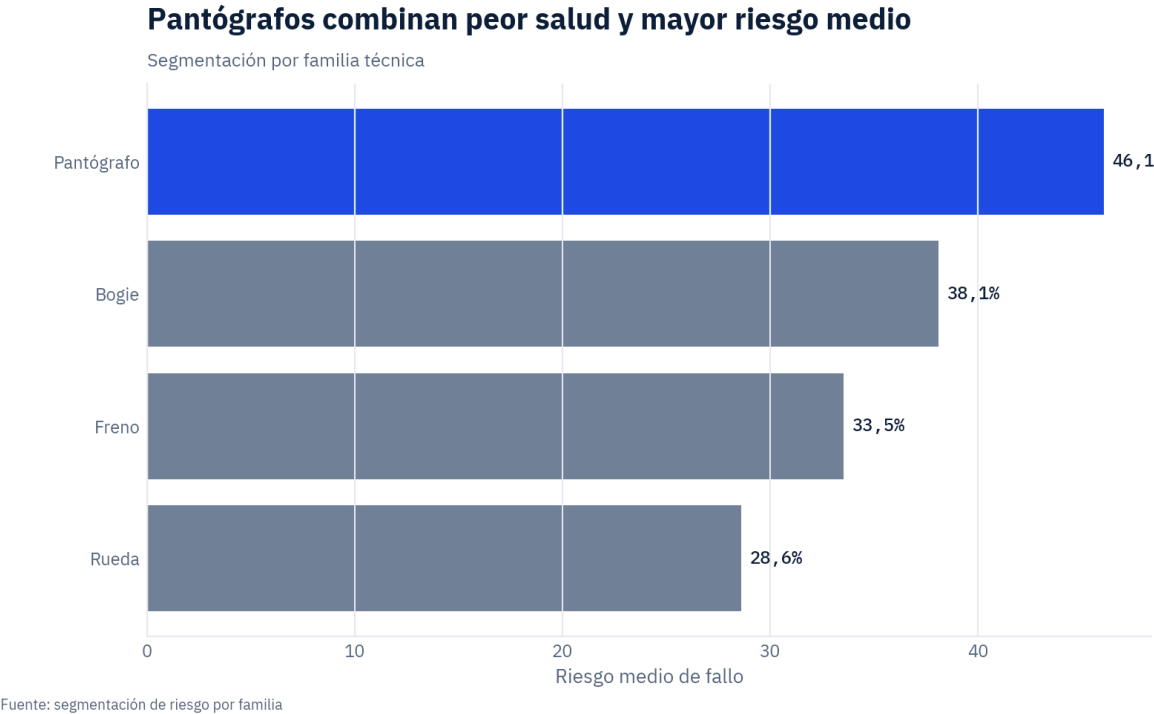


Figura. Los pantógrafos presentan el mayor riesgo medio de fallo entre las familias modeladas, con 46,1%. Fuente: segmentación de riesgo por familia.

Los pantógrafos requieren una política específica. Presentan un riesgo medio de fallo de 46,1% y una salud media de 48,3 puntos, los peores valores entre las cuatro familias. Los bogies les siguen con 38,1%, por delante de frenos (33,5%) y ruedas (28,6%). La diferencia justifica revisar umbrales, repuestos, capacidad técnica e inspección por familia. Un único acuerdo de nivel de servicio de mantenimiento para todas las familias diluye una exposición que está claramente segmentada.


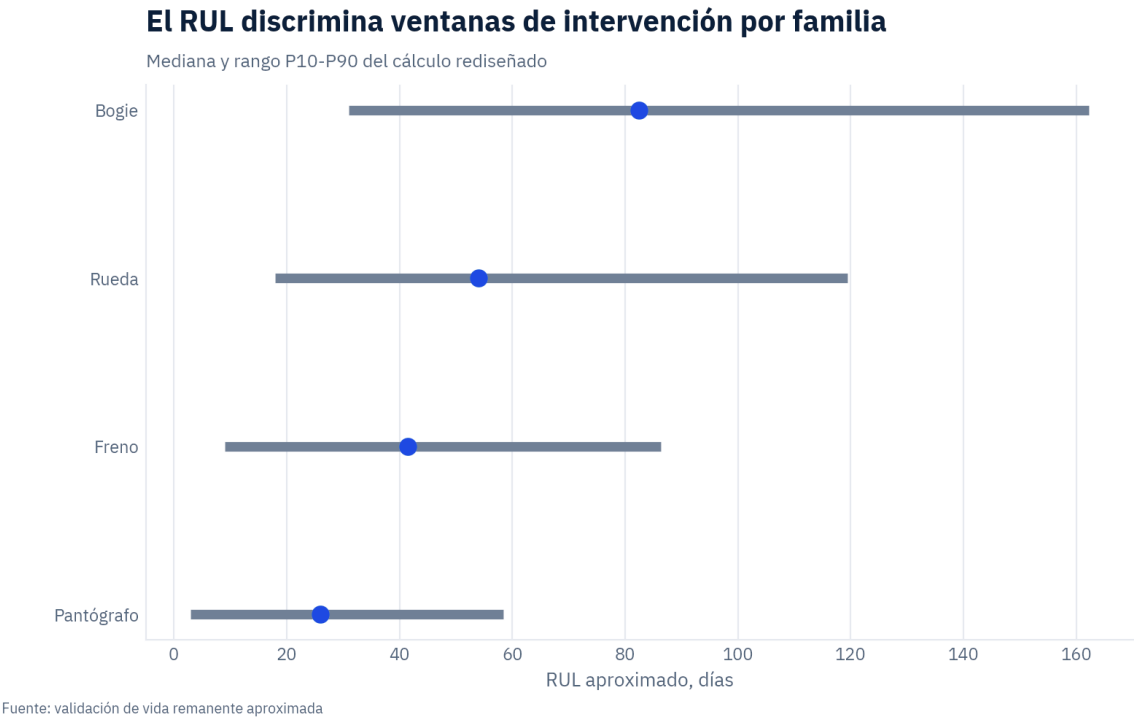


Figura. La mediana de vida remanente aproximada va de 26 días en pantógrafos a 82 días en bogies, con rangos P10-P90 también diferenciados. Fuente: validación de la vida remanente aproximada.

Las ventanas de vida remanente difieren de forma material entre familias. La mediana del pantógrafo es 26 días, frente a 42 en frenos, 54 en ruedas y 82 en bogies. Los rangos P10-P90 también se separan, lo que confirma que una regla uniforme de intervención perdería discriminación operativa. En el pantógrafo, el 56% de los componentes está dentro de la ventana de 30 días, una proporción que obliga a planificar repuesto y capacidad con antelación distinta a la del resto de familias.

El rediseño elimina la saturación artificial del RUL anterior

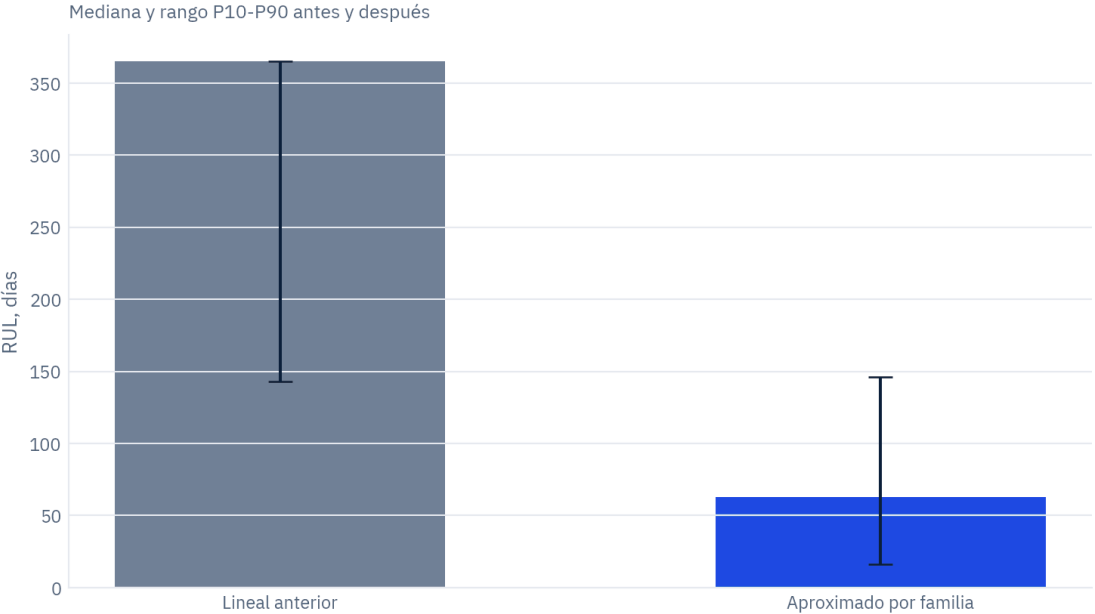

Fuente: validación de vida remanente aproximada


Figura. El modelo anterior concentraba el 71,3% de las observaciones en el tope de 365 días; el cálculo aproximado por familia reduce ese tope al 0,1%. Fuente: validación de la vida remanente aproximada.

El rediseño de la vida remanente aproximada corrige una distribución sin utilidad operativa. El modelo anterior tenía una mediana de 365 días y acumulaba el 71,3% de las observaciones en el tope, lo que lo hacía inservible para secuenciar intervenciones. El cálculo aproximado por familia reduce la mediana a 63 días y deja

prácticamente vacío el tope, con un 0,09%. La mejora principal no es de nivel sino de discriminación: el nuevo cálculo distribuye los casos entre ventanas útiles y permite combinar urgencia técnica con capacidad disponible. Sigue siendo una aproximación y no una cuenta atrás física, y así debe comunicarse.

La inspección automática tiene cobertura desigual por familia

Tasa observada de detección previa a fallo

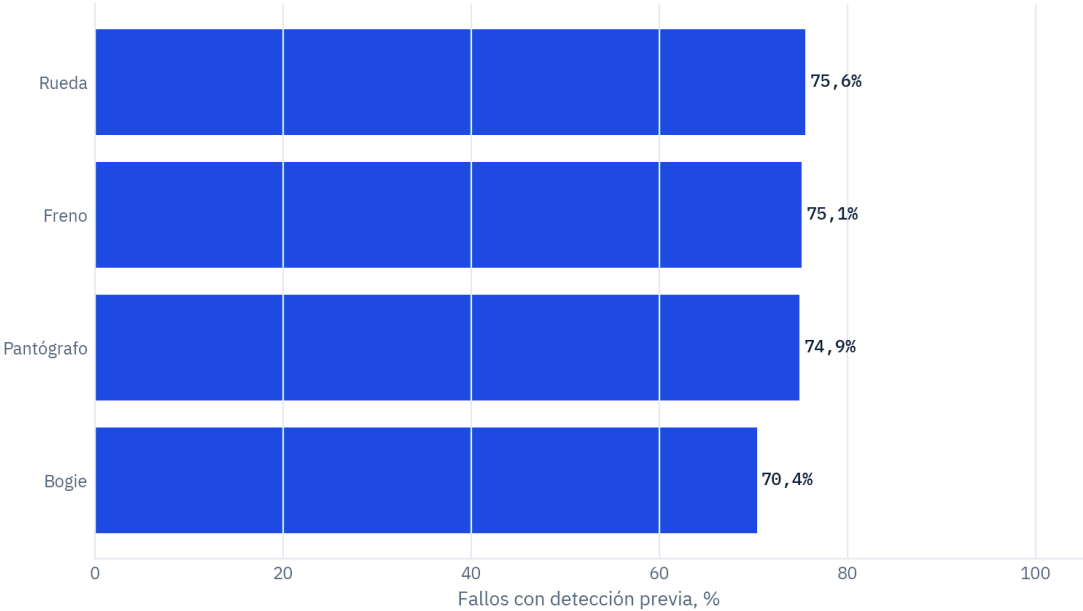

Fuente: módulo de inspección automática

Figura. La tasa de detección previa a fallo varía entre 70,4% y 75,6% según la familia. Fuente: módulo de inspección automática.

La inspección automática no rinde igual en todas las familias. La tasa de detección previa a fallo va desde el 70,4% en bogie hasta el 75,6% en rueda, con un tiempo de anticipación medio del orden de 13 días. La cobertura de componentes es total, pero la cobertura no garantiza el mismo valor de decisión: la precisión, el seguimiento y la conversión de la alerta en intervención difieren entre familias. La gestión debe medir la detección ajustada por confianza y por falsa alerta, porque aumentar el número de inspecciones sin mejorar su conversión a orden de trabajo eleva la carga sin reducir el riesgo.

El módulo de inspección tiene valor operacional medible incluso antes de cerrar el caso financiero de CBM. En el escenario comparativo reduce las correctivas estimadas en 87,7 eventos aproximados, evita 438 horas de indisponibilidad y disminuye los pendientes crítico estimado de 47,3 a 7,8. La conclusión no es desplegar inspección indiscriminadamente; es instrumentar la cadena completa alerta → orden → ejecución → resultado, porque solo esa cadena convierte detección temprana en disponibilidad preservada.

Familia	Componentes	Riesgo medio	Salud media	RUL mediana	Detección previa
Pantógrafo	144	46,1%	48,3	26 d	74,9%
Bogie	720	38,1%	53,4	82 d	70,4%
Freno	144	33,5%	52,3	42 d	75,1%
Rueda	144	28,6%	54,5	54 d	75,6%

Perfil técnico por familia. El riesgo medio y la salud proceden de la segmentación de componentes; la mediana de vida remanente, del cálculo rediseñado; la detección previa, del módulo de inspección automática.

ACCIÓN EJECUTIVA

Fiabilidad debe implantar un plan específico para pantógrafos, revisar trimestralmente la falsa alerta y la detección por familia, y usar la vida remanente únicamente por bucket y familia, validándola con cortes temporales reales antes de incorporarla a compromisos de servicio.

6. Priorización y capacidad de taller

La mejora inmediata no requiere más capacidad. Requiere proteger la cabeza de la cola priorizada y asignar mejor las horas de taller ya disponibles. La restricción dominante es de asignación y de horizonte de planificación, no de horas absolutas.

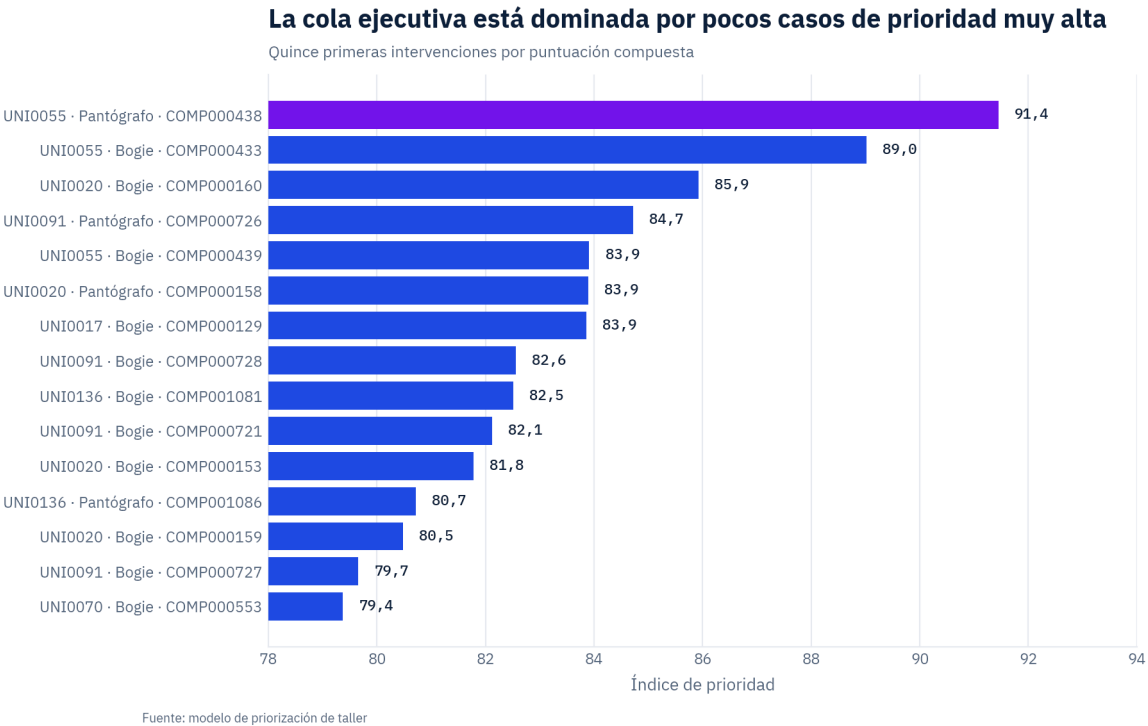


Figura. La cola ejecutiva está dominada por un grupo reducido de casos de prioridad muy alta, encabezado por UNI0055 / COMP000438. Fuente: modelo de priorización de taller.

La primera decisión está claramente identificada. UNI0055 / COMP000438 encabeza la cola con una prioridad de 91,4, un riesgo de fallo a 30 días de 90,3% y una vida remanente aproximada de 3 días. La recomendación es intervención inmediata en el depósito DEP01, dentro de una ventana de 2 días. La cola superior presenta puntuaciones próximas entre sí, de modo que la ejecución debe conservar la secuencia y registrar cualquier excepción con su motivo y su autorizador. La tabla siguiente recoge los diez primeros casos con su nivel de prioridad asignado.

La diferencia entre los tres primeros casos es de solo 5,5 puntos de prioridad. Ese margen estrecho cambia la forma de gobernar la cola: no basta con seleccionar el primer activo y olvidar el resto. Los tres primeros casos deben tratarse como un paquete de protección P1, con revisión diaria de capacidad, repuesto y ventana de servicio. Si una restricción real bloquea el primer caso, la sustitución debe elegirse dentro del mismo paquete y no mediante una nueva negociación informal de prioridades.

Nivel	Unidad / componente	Familia	Prioridad	Riesgo de diferir	Ventana	Depósito
P1	UNI0055 / COMP000438	Pantógrafo	91,4	85,8	2 d	DEP01
P1	UNI0055 / COMP000433	Bogie	89,0	78,3	7 d	DEP01
P1	UNI0020 / COMP000160	Bogie	85,9	69,2	7 d	DEP10
P2	UNI0091 / COMP000726	Pantógrafo	84,7	68,0	7 d	DEP01
P2	UNI0055 / COMP000439	Bogie	83,9	80,8	7 d	DEP01
P2	UNI0020 / COMP000158	Pantógrafo	83,9	61,4	7 d	DEP01
P2	UNI0017 / COMP000129	Bogie	83,9	70,7	7 d	DEP01
P3	UNI0091 / COMP000728	Bogie	82,6	74,0	7 d	DEP10
P3	UNI0136 / COMP001081	Bogie	82,5	68,4	7 d	DEP01
P3	UNI0091 / COMP000721	Bogie	82,1	51,0	7 d	DEP01

Cola priorizada de intervención. Niveles P1 a P3 según posición en la clasificación compuesta. Fuente: modelo de priorización de taller.

El rediseño de la planificación convierte capacidad bloqueada en casos accionables

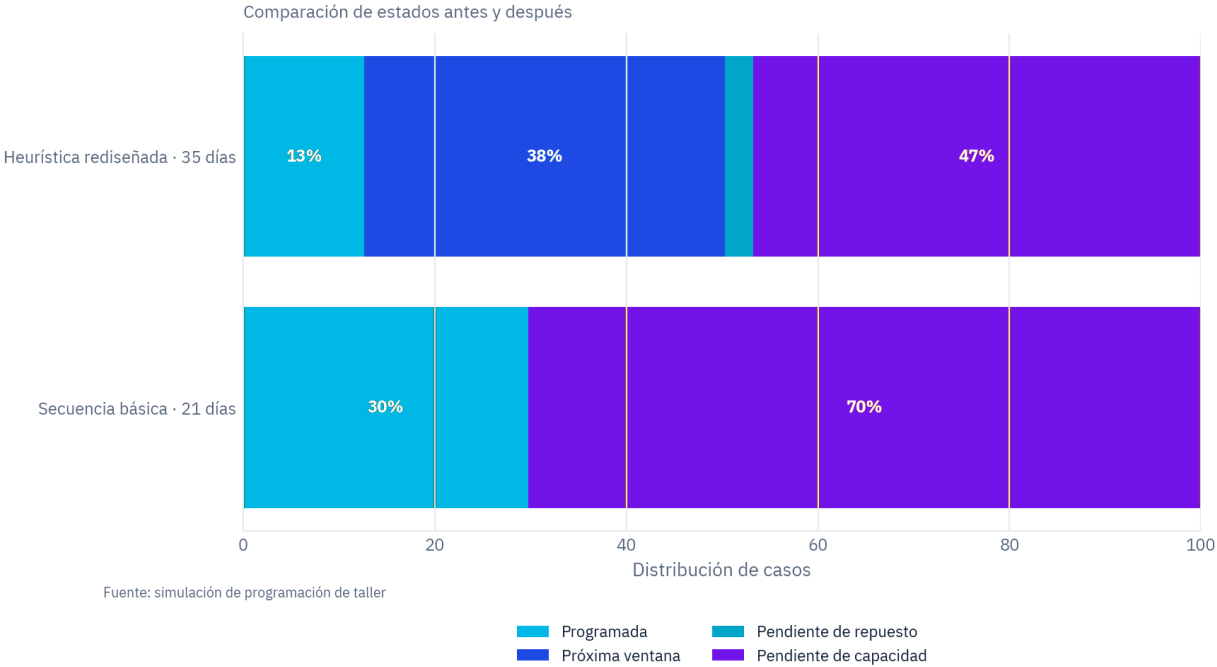


Figura. El rediseño de la programación convierte capacidad bloqueada en casos accionables y traslada parte del problema a la coordinación de repuesto. Fuente: simulación de programación de taller.

La planificación rediseñada cambia la naturaleza del cuello de botella. Los casos accionables aumentan 20,5 puntos porcentuales, del 29,8% al 50,3%. Los pendientes por capacidad bajan del 70,2% al 46,8%, y el valor capturado aproximado sube de 6,24 M€ a 7,28 M€. El rediseño introduce un 3,0% de casos pendientes de repuesto, lo que no es un defecto sino un cambio de problema: parte de la restricción se desplaza de la capacidad de taller a la coordinación de suministro, donde es más barata de resolver.

Depósito	Casos	Horas requeridas	Pendientes por capacidad	Tasa pendiente
DEP01	864	4.471,6 h	660	76,4%
DEP10	144	830,3 h	87	60,4%
DEP08	144	699,3 h	62	43,1%

Diagnóstico de cuello de botella sobre la programación rediseñada. La tasa pendiente mide casos que siguen sin absorberse por restricción de capacidad del depósito recomendado.

El cuello de botella no está repartido de forma homogénea. DEP01 reúne el 75,0% de los casos del diagnóstico y el 81,6% de los pendientes por capacidad. La lectura para gestión es directa: antes de ampliar estructura, hay que mover trabajo compatible, revisar reglas de depósito recomendado y confirmar qué restricciones son técnicas, logísticas o contractuales. Solo el remanente tras esa limpieza debe tratarse como falta estructural de capacidad.




Figura. La utilización agregada del calendario de 35 días es 45,8%, lo que confirma que el bloqueo no se explica solo por falta absoluta de horas. Fuente: calendario de capacidad de taller.

La capacidad disponible y la cola priorizada no están plenamente alineadas. La utilización agregada del calendario de 35 días es 45,8%. Frente a la base inicial, el rediseño utiliza 2.207 horas adicionales de taller y eleva la utilización 29,1 puntos porcentuales, sin agotar la red. Intervienen la compatibilidad técnica, la secuencia, la ventana operativa y el depósito asignado. La prioridad inmediata es mejorar la asignación y la

flexibilidad controlada; cualquier expansión de capacidad debe justificarse después de medir qué restricciones permanecen activas una vez estabilizado el rediseño, para no consolidar como estructural una ineficiencia que es de asignación.

La presión de taller está desigualmente distribuida entre depósitos

Corte a 2025-12-31

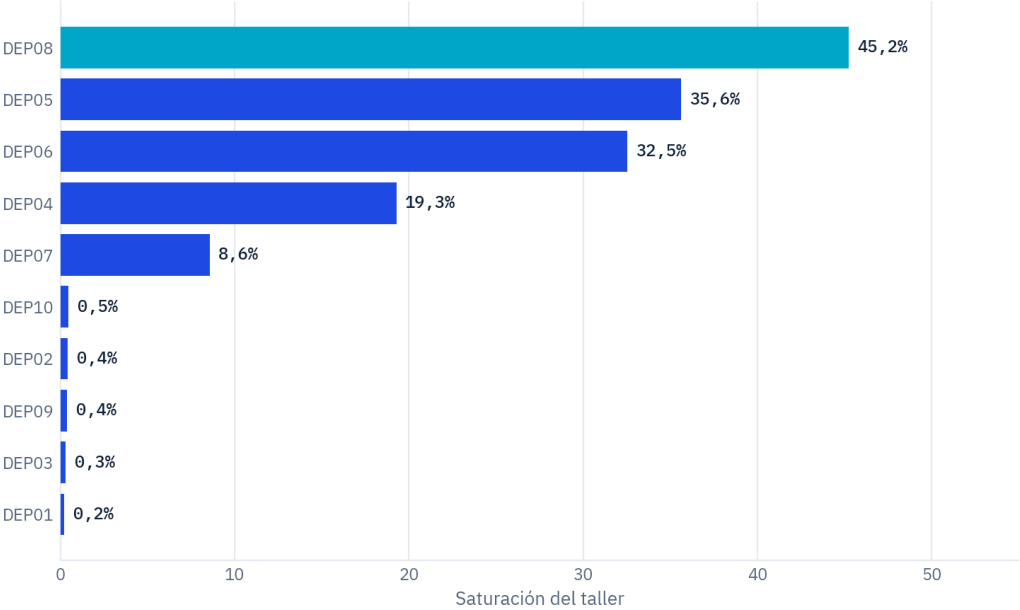

Fuente: tabla analítica de presión de talleres

Figura. La saturación de taller está desigualmente distribuida; el depósito más exigido es DEP08 con 45,2% en el corte. Fuente: tabla analítica de presión de talleres.

La presión de depósito exige rebalanceo antes que expansión. El depósito más exigido es DEP08, con 45,2% de saturación en el corte, frente a una saturación media de la red del 14,3%. Ese nivel no prueba una insuficiencia estructural de capacidad a escala de red, sino una dispersión que apunta primero a reasignación controlada, compatibilidad técnica y ajuste del calendario. Invertir en capacidad antes de corregir la asignación consolidaría las ineficiencias existentes en lugar de eliminarlas.

ACCIÓN EJECUTIVA


Planificación de Taller debe congelar la secuencia P1 durante 14 días, exigir autorización ejecutiva para cualquier excepción y formalizar la heurística de 35 días midiendo semanalmente accionabilidad, pendientes por capacidad, pendientes por repuesto y riesgo residual.

7. Economía y decisión estratégica

El mantenimiento basado en condición mejora el servicio, pero el diferencial económico actual no soporta una afirmación de ahorro. La honestidad de esta conclusión es lo que protege la credibilidad del resto del informe.

La ventaja de servicio de CBM no se traduce en ahorro bajo los supuestos actuales

Valor esperado y rango P10-P90 frente a la estrategia reactiva

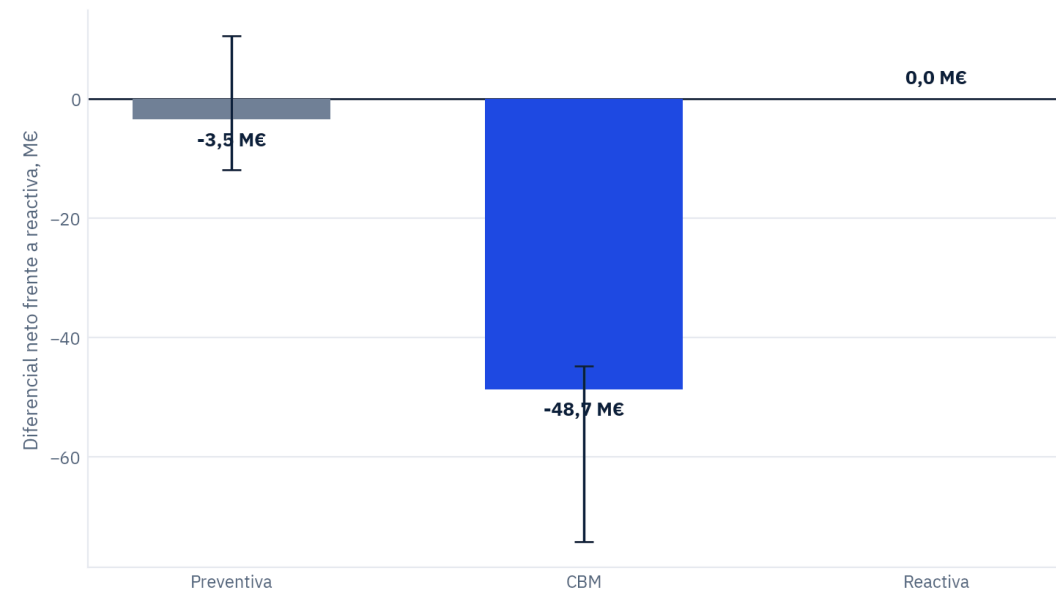

Fuente: simulación de estrategias de mantenimiento

Figura. CBM mejora la disponibilidad frente a reactiva, pero su diferencial neto esperado es -48,7 M€ bajo los supuestos actuales. Fuente: simulación de estrategias de mantenimiento.

CBM compra disponibilidad, no ahorro, bajo el escenario vigente. Alcanza un 96,78% de disponibilidad frente al 95,86% de la estrategia reactiva, una mejora de 0,93 puntos porcentuales, y preserva del orden de 18.603 horas de servicio adicionales. El coste, sin embargo, también es mayor: el coste total esperado aproximado de CBM es 246,1 M€, frente a 197,4 M€ de la reactiva y 200,8 M€ de la preventiva rígida. El diferencial neto esperado de CBM frente a reactiva es -48,7 M€, con un rango estimado entre -74,2 M€ y -44,7 M€ y una probabilidad modelada de ahorro positivo del 0%.

La comparación con la preventiva rígida endurece la tesis financiera. CBM aporta solo 0,11 puntos porcentuales adicionales de disponibilidad frente a preventiva, pero añade 45,2 M€ de coste esperado aproximado. Frente a reactiva, cada punto porcentual adicional de disponibilidad cuesta aproximadamente 52,6 M€ en el escenario base. Ese precio puede estar justificado si la disponibilidad tiene valor corporativo alto; lo que no está justificado es presentarlo como ahorro sin validar ese valor.

Comparación de estrategias sobre el escenario base. El diferencial y las horas preservadas se miden frente a la estrategia reactiva. Los importes son proxies técnico-operativos, no P&L. Las cifras se redondean de forma independiente a partir de los valores completos; el diferencial puede no coincidir exactamente con la resta de las cifras de coste ya redondeadas. Fuente: simulación de estrategias de mantenimiento.

La decisión necesita un precio sombra explícito para la disponibilidad y para las horas de servicio preservadas. Bajo el escenario base, ese umbral es calculable: el coste incremental aproximado de CBM queda compensado si la organización valora cada hora de servicio preservada en al menos € 2.618 por hora; por debajo de ese umbral, la mejora de disponibilidad no justifica el mayor coste, y no debe comprometerse capital sobre la base de un ahorro que el modelo no muestra. Este umbral es un punto de partida para la discusión de comité, no una cifra validada: debe contrastarse contra el valor corporativo real de la disponibilidad antes de usarse en una decisión de inversión. La preventiva rígida ocupa una posición intermedia interesante, con una probabilidad de ahorro positivo del 38% y un rango que en su extremo superior alcanza 10,6 M€.

Sensibilidad de CBM frente a reactiva en los perfiles conservador, base y agresivo. Los importes son diferenciales netos aproximados; valores negativos indican coste incremental.


Estrategia	Disponibilidad	Coste total aproximado	Diferencial vs reactiva	Prob. ahorro >0	Horas servicio preservadas
Reactiva	95,86%	197,4 M€	0,0 M€	0%	0 h
Preventiva rígida	96,67%	200,8 M€	-3,5 M€	38%	16.323 h
CBM	96,78%	246,1 M€	-48,7 M€	0%	18.603 h

La sensibilidad refuerza la disciplina del mensaje. CBM tiene un 0,0% de casos con ahorro positivo en la malla completa de 2.187 escenarios, con diferenciales entre -92,2 M€ y -34,8 M€. La preventiva rígida cruza a positivo en 38,4% de sus escenarios, con rango entre -19,8 M€ y 28,6 M€. La consecuencia para comité es precisa: aprobar la ejecución operativa basada en riesgo, pero exigir una segunda puerta financiera antes de escalar CBM como programa de inversión.

Perfil CBM	Mediana vs reactiva	Peor caso	Mejor caso	Ahorro positivo
Agresivo	-49,9 M€	-60,7 M€	-36,9 M€	0,0%
Base	-51,2 M€	-67,1 M€	-34,8 M€	0,0%
Conservador	-68,9 M€	-92,2 M€	-44,9 M€	0,0%

La conclusión económica depende del perfil de escenario

Dispersión del coste P50 entre perfiles de sensibilidad

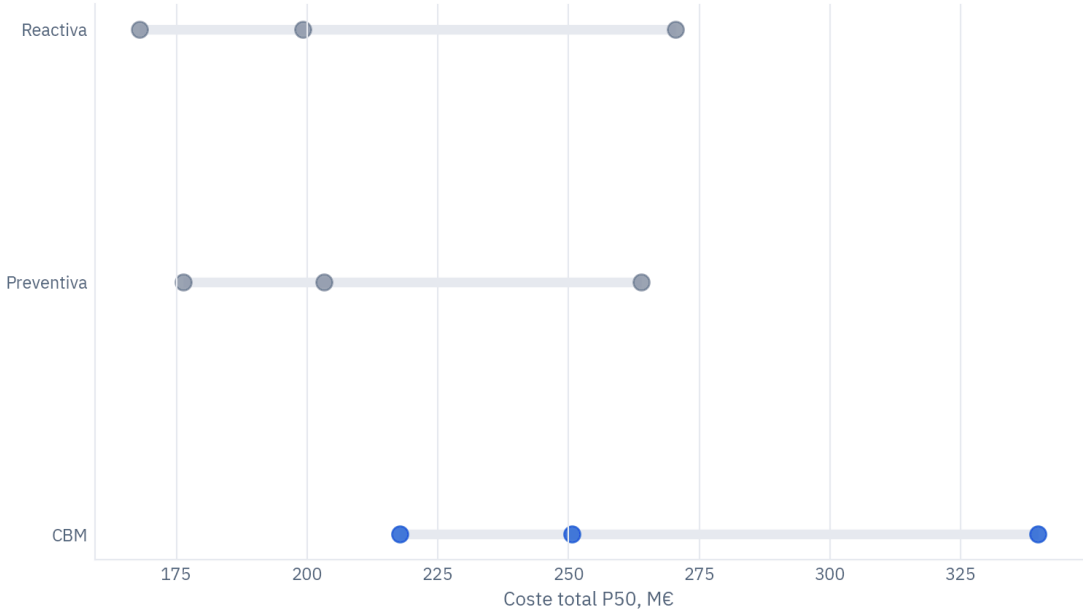

Fuente: simulación de sensibilidad estratégica


Figura. Los perfiles de escenario desplazan el coste P50 de cada estrategia y amplían la incertidumbre, sin revertir la dirección operativa. Fuente: simulación de sensibilidad estratégica.

La incertidumbre económica cambia la confianza, no la dirección operativa. Los perfiles de escenario desplazan el coste P50 de cada estrategia y amplían el rango de comparación; la preventiva rígida se aproxima al coste reactivo en algunos perfiles, mientras que CBM conserva el mayor coste aproximado bajo los

supuestos vigentes. La dirección operativa, en cambio, permanece estable a través de los escenarios: reducir correctivas, proteger horas de servicio y anticipar componentes críticos. Esa estabilidad es la que permite actuar ya en lo operativo mientras la decisión de inversión espera una calibración financiera con costes reales.

Aplazar traslada coste al servicio y amplifica la indisponibilidad

Escenarios de diferimiento de la cola priorizada

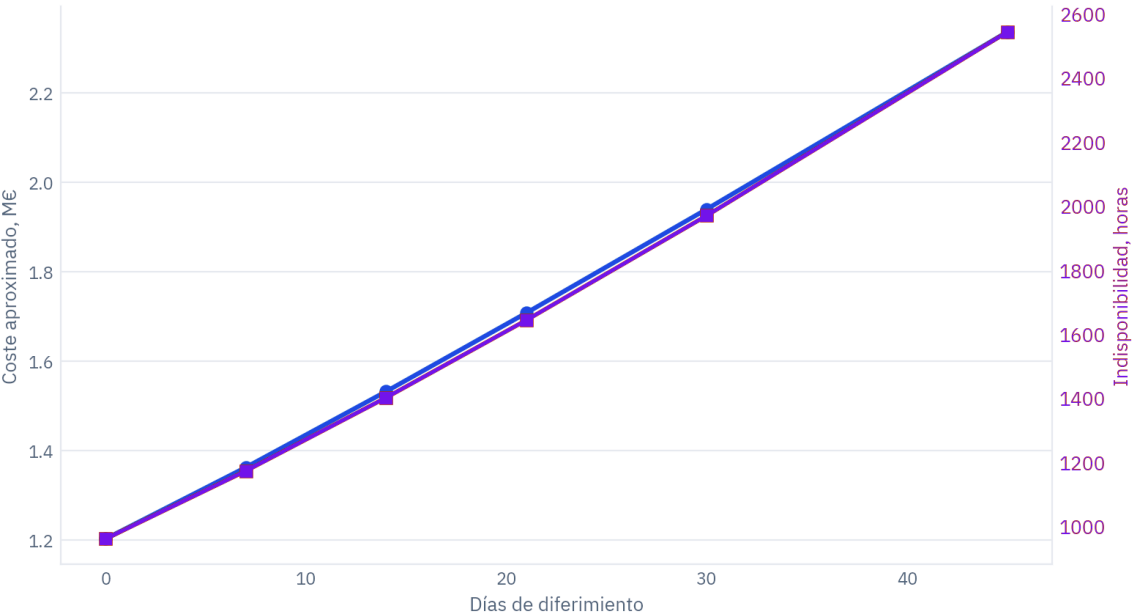

Fuente: simulación de diferimiento

Figura. El coste de aplazar crece de forma monótonica: a 45 días el coste aproximado alcanza 2,34 M€ y la indisponibilidad 2.544 horas. Fuente: simulación de diferimiento.

Aplazar transfiere coste al servicio y amplifica la indisponibilidad. El escenario base estima 1,20 M€ y 961 horas de indisponibilidad. A 14 días, los valores suben a 1,53 M€ y 1.402 horas; a 45 días, alcanzan 2,34 M€ y 2.544 horas. La probabilidad media de fallo de la cola pasa del 59% al 78% en ese intervalo. La curva confirma que el aplazamiento no debe usarse como mecanismo general para absorber presión de taller; debe reservarse para casos con bajo riesgo de diferimiento, señal débil o restricción material demostrable, y cada aplazamiento de un caso P1 debe registrar la restricción, el responsable, la nueva fecha y la exposición incremental.

Diferimiento	Prob. fallo media	Indisponibilidad	Coste total aproximado
0 d	59%	961 h	1,20 M€
7 d	62%	1.173 h	1,36 M€
14 d	66%	1.402 h	1,53 M€
21 d	69%	1.644 h	1,71 M€
30 d	72%	1.970 h	1,94 M€
45 d	78%	2.544 h	2,34 M€

Escenarios de diferimiento de la cola priorizada. Cada fila acumula el efecto de posponer la intervención el número de días indicado. Fuente: simulación de diferimiento.

ACCIÓN EJECUTIVA

El CFO y la Dirección de Mantenimiento deben recalibrar costes, habilitación y valor de disponibilidad antes de someter la inversión en CBM a aprobación, e implantar una aprobación formal de los diferimientos P1 con el coste y las horas incrementales visibles en la decisión.

8. Riesgos, limitaciones y cautelas

Los resultados son rigurosos dentro de un entorno sintético, pero no son evidencia de producción. Los datos reproducen relaciones plausibles entre deterioro, fallo, inspección y mantenimiento, pero no una red ferroviaria real. Las puntuaciones, umbrales y distribuciones demuestran arquitectura y lógica de decisión; no validan precisión externa, causalidad física ni impacto financiero. Esta distinción es la cautela central del informe y debe acompañar cualquier comunicación de sus cifras.

Antes de un uso en producción deben recalibrarse los modelos de fallo, los costes, la disponibilidad, los tiempos de reparación, la capacidad, las ventanas operativas y las taxonomías con datos observados. La validación debe incluir validación retrospectiva temporal, estabilidad de la clasificación por flota y depósito, revisión de falsos positivos y, sobre todo, el resultado de las órdenes efectivamente ejecutadas, que es la única prueba de que la puntuación ordena casos cuya intervención reduce de verdad fallos e indisponibilidad.

Criterios mínimos para pasar del prototipo analítico a uso operativo controlado.

RIESGO PRINCIPAL

Convertir una demostración coherente en una política automática sin calibración con datos reales. La calidad interna del prototipo puede generar una confianza que los datos sintéticos no respaldan.

Cuatro interpretaciones incorrectas deben bloquearse

Primera, tratar la vida remanente como fecha exacta de fallo en lugar de como bucket relativo de ventana. Segunda, interpretar el coste aproximado como un caso financiero cerrado y no como un instrumento para visualizar compensaciones. Tercera, confundir los pendientes físicos con el riesgo de diferimiento, que miden

Puerta de producción	Evidencia exigida	Restricción si no se cumple
Datos reales integrados	Sensores, órdenes, fallos, disponibilidad, repuestos y capacidad con linaje y responsabilidad funcional.	Usar puntuaciones solo en piloto controlado; no automatizar órdenes.
Validación temporal	Validación retrospectiva por familia, flota y depósito; estabilidad de clasificación; falsos positivos y falsos negativos.	Ajustar umbrales por familia antes de escalar.
Economía calibrada	Costes corporativos, valor de hora de servicio, coste de habilitación, inventario y capacitación.	No aprobar CBM como caso de negocio de ahorro.
Modelo operativo aprobado	RACI de excepción, autorizadores, trazabilidad de diferimientos y circuito alerta-orden-ejecución.	Mantener recomendación como soporte de decisión, no como automatismo.

cosas distintas. Cuarta, asumir que la correlación de una señal con la puntuación identifica una causa física. Cada una de estas lecturas está explícitamente prohibida en los contratos de métricas, y mantener esa prohibición activa es parte del diseño, no una nota a pie de página.

Existen además limitaciones de método que conviene declarar. La planificación es heurística y no garantiza un óptimo global; su valor está en mejorar la asignación, no en demostrar optimalidad. La inspección automática se evalúa con métricas aproximadas sobre cobertura sintética. La recomendación de depósito requiere validar competencias técnicas, disponibilidad de repuesto, logística y restricciones contractuales que el modelo no incorpora. Ninguna de estas limitaciones invalida las conclusiones operativas, pero todas acotan el grado de automatización admisible antes de la calibración.

9. Recomendaciones y prioridades de acción

Las recomendaciones se ordenan por horizonte y se atan a la evidencia de las secciones anteriores. La secuencia separa lo que debe ejecutarse de inmediato de la calibración necesaria para decidir inversión.

Prioridades para los próximos 30 días

Ejecutar la intervención de UNI0055 / COMP000438 y revisar diariamente la cola de 43 casos con alto riesgo de diferimiento, registrando motivo y autorizador para cualquier excepción. Adoptar la heurística de 35 días como base inicial operativa controlada y medir semanalmente la accionabilidad, los pendientes por capacidad, los pendientes por repuesto, el riesgo residual y el valor capturado. Abrir el rebalanceo en dos frentes: aliviar DEP08 por saturación del corte y revisar DEP01 como cuello de botella de la planificación rediseñada, reasignando trabajo compatible a instalaciones con holgura.

Crear un frente específico para pantógrafos y para los cinco modos de fallo más repetitivos, vinculando cada acción a una causa raíz, un responsable, una fecha objetivo y una evidencia posterior de reducción de reincidencia. Estas tres líneas (proteger la cabeza de cola, corregir la asignación de taller y reducir la repetición por familia) son las que capturan el valor de gestión sin necesidad de inversión adicional.

Agenda de ejecución propuesta para comité. Los controles son métricas de gobierno, no promesas de impacto financiero sin calibración real.

ORDEN DE PRIORIDAD

Prioridad 1: proteger servicio en la cabeza de la cola. Prioridad 2: corregir la asignación de taller. Prioridad 3: reducir la repetición de fallos por familia.

Horizonte	Responsable	Mandato	Control ejecutivo
0-14 días	Dirección de Mantenimiento + Planificación	Ejecutar P1/P2, proteger repuesto y bloquear excepciones no autorizadas.	43 casos de alto riesgo con revisión diaria.
15-30 días	Planificación de Taller	Adoptar programación a 35 días y publicar tablero semanal de restricciones.	Accionabilidad +20,5 p.p.; riesgo residual -24,2 p.p.
31-60 días	Operaciones + Jefes de depósito	Rebalancear DEP08 / DEP01 y validar compatibilidad técnica.	81,6% de pendientes por capacidad concentrados en el cuello de botella.
61-120 días	CFO + Fiabilidad	Recalibrar costes, umbrales, RUL y valor de disponibilidad con datos reales.	Puerta CBM: valor validado >= € 2.618/h o caso alternativo.

Decisiones de 60 a 120 días

Calibrar el riesgo de fallo y los buckets de vida remanente con histórico real, usando cortes temporales y métricas por familia, e incorporar la respuesta a la intervención para comprobar si la puntuación ordena casos que efectivamente reducen fallos e indisponibilidad. Construir el caso económico con costes corporativos auditables, valorando de forma explícita las horas de servicio preservadas, las correctivas evitadas, el coste de habilitación, el inventario, la capacitación y el riesgo de ejecución. Sin ese paso, la estrategia CBM no debe presentarse como ahorro.

Evaluar la optimización matemática de la planificación solo después de estabilizar reglas, datos y restricciones. Un optimizador construido sobre supuestos débiles produce precisión aparente, no una mejor decisión, y trasladaría a la organización una falsa sensación de rigor. La hoja de ruta, en síntesis, ejecuta de inmediato lo que la evidencia operativa ya soporta y reserva la inversión para cuando exista calibración financiera.

0-30 días	31-60 días	61-120 días
• Ejecutar la cola P1 y blindar los casos de alto riesgo de diferimiento • Adoptar la ventana de programación de 35 días • Registrar excepciones, causas y autorizadores	• Rebalancear carga entre depósitos desde el más saturado • Plan de causa raíz para pantógrafos y modos repetitivos • Medir restricciones residuales tras el rediseño	• Calibrar costes y valor de disponibilidad con datos reales • Validar riesgo y vida remanente con cortes temporales • Preparar la decisión de inversión en CBM

El comité ejecutivo debe revisar cinco métricas mensuales: casos P1 ejecutados, riesgo residual, utilización por depósito, reincidencia por modo y diferencial económico recalibrado.

Apéndice. Métricas, fuentes e interpretación

La tabla siguiente recoge las métricas oficiales utilizadas para comunicar resultados, con su valor y su fuente de verdad. Las definiciones completas, los filtros y las reglas de agregación permanecen en el registro procesado de métricas, que es el origen único del que leen el panel de control, el README y este informe.

Métrica	Valor	Fuente de verdad
Disponibilidad media de flota	95,75%	Tabla analítica semanal de flota
Tiempo medio entre fallos (aproximado)	1.046,8 h	Tabla analítica semanal de flota
Tiempo medio de reparación (aproximado)	5,2 h	Tabla analítica semanal de flota
Unidades de alto riesgo	9	Modelo de riesgo de unidad
Pendientes físicos	2.056	Registro de pendientes
Pendientes vencidos	2.011	Registro de pendientes
Pendientes críticos físicos	1.955	Registro de pendientes
Casos con alto riesgo de diferimiento	43	Modelo de priorización
Saturación media de depósito	14,3%	Tabla analítica de presión de talleres
Saturación del depósito más exigido	45,2%	Tabla analítica de presión de talleres
Mejora de disponibilidad de CBM	+0,93 p.p.	Simulación estratégica
Diferencial neto de CBM frente a reactiva	-48,7 M€	Simulación estratégica
Valor sombra de equilibrio de CBM por hora de servicio	€ 2.618/h	Simulación estratégica
Coste incremental al diferir 14 días	0,33 M€	Simulación de diferimiento
Indisponibilidad incremental al diferir 14 días	441 h	Simulación de diferimiento

Guía de interpretación

Cada indicador tiene una función de decisión y una interpretación explícitamente bloqueada. Esta disciplina debe mantenerse en cualquier extensión del panel de control o del informe, porque es la que impide que una cifra útil para un fin se utilice para otro que no soporta.

Indicador	Uso correcto	Interpretación bloqueada
Salud	Condición técnica actual del componente	No es probabilidad de fallo
Riesgo a 30 días	Ordenar propensión a fallo a corto plazo	No prueba causalidad física
Vida remanente	Bucket relativo de ventana de intervención	No es fecha exacta de fallo
Pendientes físicos	Carga de mantenimiento pendiente real	No equivale a riesgo de diferimiento
Riesgo de diferimiento	Daño esperado de aplazar una decisión	No equivale a pendientes críticos
Saturación de taller	Uso relativo de la capacidad del depósito	No mide productividad
Valor estratégico	Comparar compensaciones entre estrategias	No es P&L ni ahorro contractual
Valor sombra de equilibrio	Valorar una hora de servicio en el comité	No es una cifra de mercado validada

Conclusión: ejecutar la cola de intervención basada en riesgo, corregir la asignación de capacidad y condicionar la inversión en CBM a una calibración económica honesta. Las cifras que sostienen esa decisión proceden de 1.152 componentes críticos, 144 unidades y 50 controles de gobernanza sin bloqueos activos, y todas son reproducibles desde el flujo.
